


**Eiropas Reģionālā attīstības fonda Projekta Nr.4.1.1/1/23/I/003
Īstenošanas progress 2025. gada 2. un 3. ceturksnī**

Projekta Nr.4.1.1/1/23/I/003 "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana SIA "Rīgas Dzemdību nams", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" (turpmāk – Projekts) īstenošana 2025. gada 2. un 3. ceturksnī noritējusi saskaņā ar 2024. gada 20. jūnijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un SIA "Rīgas Dzemdību nams" noslēgto līgumu.

Ar 31.03.2025. iepirkumu komisijas lēmumu konkursa "Būvdarbi Dzemdību nama Operāciju bloka pārbūvei" ar ID Nr.RDzN 2025/4/K/ESF rezultātā slēdzams līgums ar pretendentu SIA "LC būve" (reģistrācijas Nr. 40003038782) par kopējo līguma summu 1 162 313,15 EUR bez PVN.

19.05.2025. noslēgtais līgums par būvdarbu veikšanu paredz saskaņā ar projektu paredzētos būvdarbus veikt astoņu mēnešu laikā – līdz 2026. gada 18. janvārim.

Pašlaik būvniecības darbi objektā noris saskaņā ar noteikto plānu – ir veikti demontāžas darbi, pārseguma pārbūve ventilācijas iekārtu uzstādīšanai un citi būvdarbi saskaņā ar noteikto plānu, atbilstoši jaunatklātajiem tehniskajiem apstākļiem nedaudz precizēti būvniecības darbu apjomi.

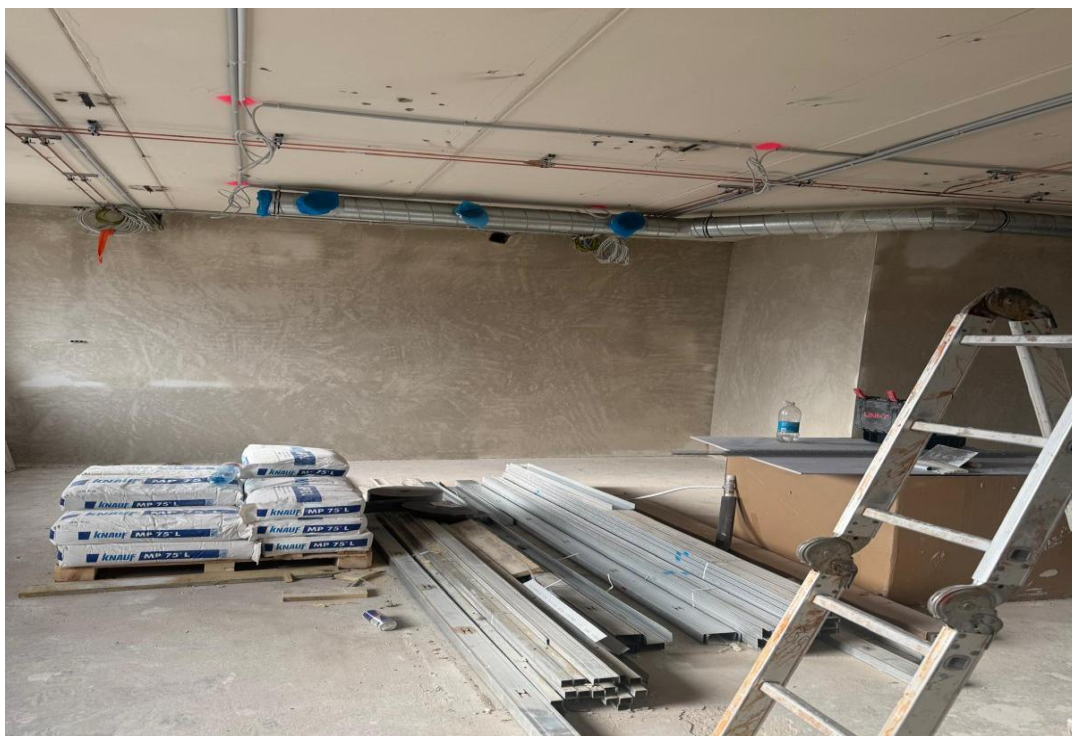

Būvuzraudzību objektā realizē SIA "Marčuks", (reģistrācijas Nr. LV42403037066),

Lai nodrošinātu korektu un savlaicīgu iebūvējamo tehnoloģiju piegādi, izsludināts iepirkums – Medicīniskās tehnoloģijas, iekārtas Operāciju blokam un Ambulatoriskās nodaļas Prenatālās diagnostikas centram II.A kārtā medicīnisko gāzes konsoļu un digitālo operācijas lampu ar videoierakstu veikšanas funkcijām iegādei.

Konstruktīvā Projekta vadības grupas, Ārstniecības jomas atbildīgo speciālistu un struktūrvienību vadītāju un būvdarbu veicēju, būvuzraugu un autoruzraugu sadarbībā tiek saskaņoti darbības plāni un aktivitāšu termiņi, lai Projekta realizācijas laikā nodrošinātu pacientu aprūpi atbilstoši kvalitātes standartiem un pacientu drošības prasībām.

Objekta pārbūves laikā Operāciju bloks un Intensīvās terapijas palātas pārvietotas ēkas 1. stāvā, Infekciju izolatora telpās. Pateicoties saskaņotam komandas darbam spējam nodrošināt kvalitatīvu un ģimenes centrētu ārstniecību un aprūpi arī platības ziņā nelielākā, bet visām epidemioloģiskās drošības prasībām atbilstošā infrastruktūrā.

Informāciju sagatavoja: Santa Markova, SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja. santa.markova@rdn.lv, tel. +371 67011222
